


Classe	Disciplina	Grupo	Data	Nota	Aluno	Prof.
Identificação	Título do Trabalho			Conteúdo		
T09	Fluxo de Caixa do Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado			Sub-Total		
Elaborador	RA	Nome		Texto/Visual		
Avaliador	RA	Nome		Matemática		

Fluxo de Caixa Projeto Construção da Ponte Sobre o Rio Lambari Dourado

EAP	Atividades	QTD	UM	Custo Total 1000XR\$	Plano de Pgto	1	2	3	4	5	6	7	8										
1	Fundação																						
1.1	Estacas																						
	a	Execução de estacas	Verba	900,0		450,0	450,0																
					a																		
2	Estruturas																						
	a	Coloc. e retir. de fôrmas	500,0	m2	36,0	b	12,0	12,0					12,0										
	b	Fixação de armaduras	VERBA	4.389,1	a			1.097,3	1.097,3	1.097,3	1.097,3												
	c	Concretagem	VERBA	1.561,0	a					520,3	520,3	520,3											
	Orçamento R\$ 1 000			6.886,1																			
	Custo Mensal R\$ 1 000												450,0	462,0	12,0	1.097,3	1.097,3	1.617,6	1.617,6	532,3			
	Custo Acumulado R\$ 1 000												450,0	912,0	924,0	2.021,3	3.118,5	4.736,2	6.353,8	6.886,1			

[illegible]

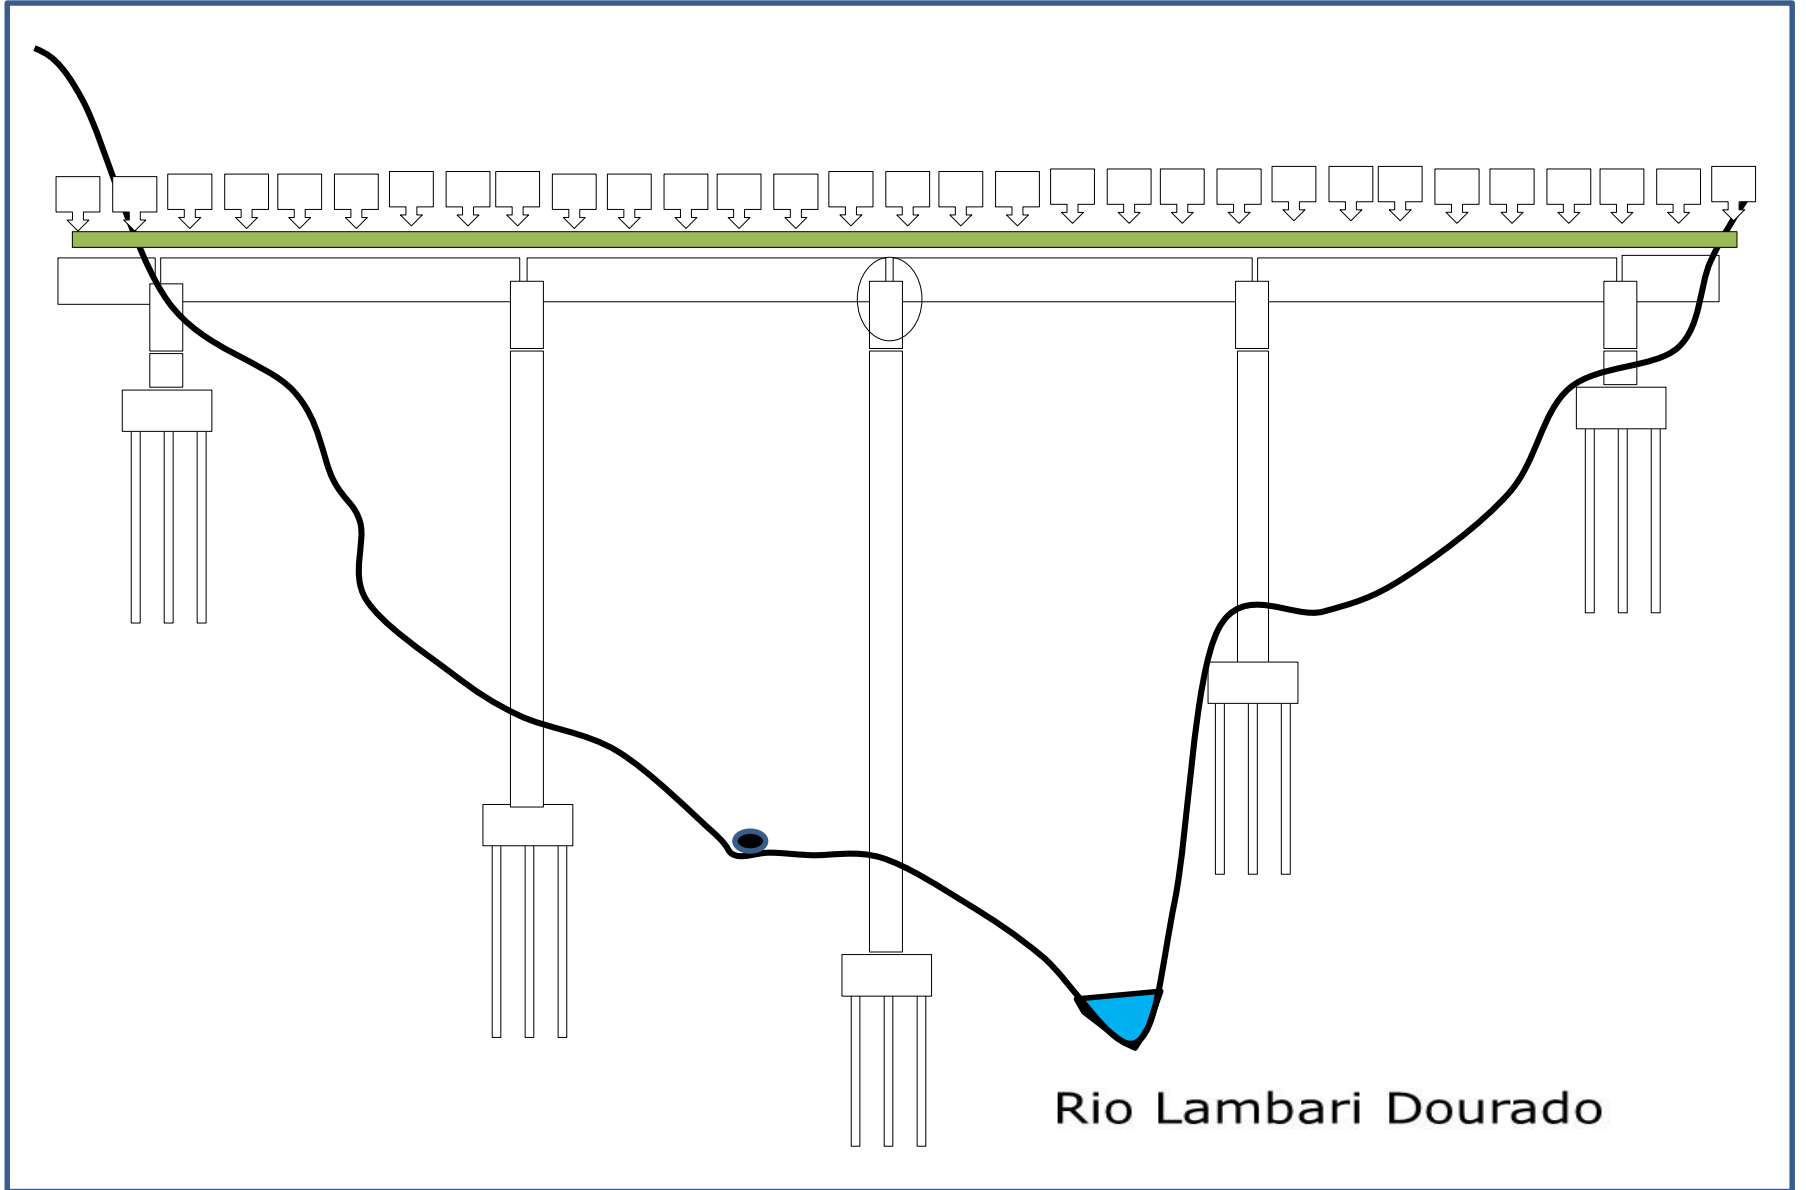

Fluxo de Caixa Projeto Galpão				UM	QTD	Custo Total/Verba R\$ 1000	Plano de Pgto.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.Fundação																			
1.1 Bloco																			
a) Escavação e Reaterro				VB		5,00	a	5,00											
Pagamento						5,00			5,00										
1.1 Bloco a) Escavação e reaterro. Forma de pagamento: a. Pagamento mensal, a partir do mês seguinte do encerramento da atividade.																			
Pagamento retenção de 10%						3,00									3,00				
2.2 Cobertura																			
d) Forn. e colocação				VB		15,00	a					7,50	7,50						
Pagamento mensal						15,00						7,50	7,50						
e) Pintura				VB		60,00	a						15,00	15,00	15,00	15,00			
Pagamento mensal						60,00								15,00	15,00	15,00	15,00		
Custo Mensal Total R\$ 1000						180,00		40,00	45,00	10,00	17,50	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00			
Custo Mensal Total Acunulado R\$ 1000								40,00	85,00	95,00	112,50	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00			
Pagamento Mensal Total R\$ 1000						180,00			22,50	26,50	26,50	34,00	7,50	15,00	18,00	15,00	15,00		
Pagamento Mensal Total Acumulado R\$ 1000									22,50	49,00	75,50	109,50	117,00	132,00	150,00	165,00	180,00		
Recebimento Lucratividade de 25%																			
Verba de Mobilização								22,5											
Recebimentos Mensais R\$ 1000					25,00%					50	56,25	12,5	21,875	9,375	18,75	18,75	18,75	18,75	
Recebimentos Acumulados R\$ 1000								22,5	22,5	72,5	128,75	141,25	163,125	172,5	191,25	210	228,75	247,5	
Superávit /Déficit								22,50	0,00	23,50	53,25	31,75	46,13	40,50	41,25	45,00	48,75	247,50	

Forma de pagamento

- a Pagamento mensal, a partir do mês seguinte do encerramento da atividade.
- b Mensal 30 dias após a execução dos serviços, com retenção de 10% a pagar 90 dias após conclusão dos serviços contratados.
- c Mão de obra: 30% dos custos, no mês seguinte.
Material: 50% do custos, 60 dias fora o mês.
Aluguel de equipamentos: 20% dos custos, no mês seguinte.

Forma de recebimento

- 1 Medição: 30 dias fora o mês.
- 2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato. R\$ 22,50 X 1000

Fluxo de Caixa Projeto Galpão				UM	QTD	Custo Total/Verba R\$ 1000	Plano de Pgto.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Fundação																		
1.1 Bloco																		
a) Escavação e Reaterro				VB		5,00	a	5,00										
Pagamento						5,00			5,00									
b)Forn. e Concretagem				M3	100	70,00	c	35,00	35,00									
Pagamentos																		
Salários 30%						21,00			10,50	10,50								
Materiais 50%						35,00					17,50	17,50						
Aluguel de equipamentos 20%						14,00			7,00	7,00								
1.1 Bloco																		
b) Fornecimento e concretagem.																		
Forma de pagamento:																		
c. Mão de Obra: 30% dos custos no mês seguinte.																		
Materiais: 50% dos custos 60dias fora o mês.																		
Aluguel de Equipamentos: 20% dos custos no mês seguinte.																		
Pagamento Mensal Total Acumulado R\$ 1000								22,50	49,00	75,50	109,50	117,00	132,00	150,00	165,00	180,00		
Recebimento Lucratividade de 25%																		
Verba de Mobilização								22,5										
Recebimentos Mensais R\$ 1000						25,00%			50	56,25	12,5	21,875	9,375	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Recebimentos Acumulados R\$ 1000								22,5	22,5	72,5	128,75	141,25	163,125	172,5	191,25	210	228,75	247,5
Superávit /Déficit								22,50	0,00	23,50	53,25	31,75	46,13	40,50	41,25	45,00	48,75	247,50

Forma de pagamento

- a Pagamento mensal, a partir do mês seguinte do encerramento da atividade.
- b Mensal 30 dias após a execução dos serviços, com retenção de 10% a pagar 90 dias após conclusão dos serviços contratados.
- c Mão de obra: 30% dos custos, no mês seguinte.
Material: 50% do custos, 60 dias fora o mês.
Aluguel de equipamentos: 20% dos custos, no mês seguinte.

Forma de recebimento

- 1 Medição: 30 dias fora o mês.
- 2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato. R\$ 22,50 X 1000

Fluxo de Caixa Projeto Galpão				UM	QTD	Custo Total/Verba R\$ 1000	Plano de Pgto.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Fundação																		
1.1 Bloco																		
a) Escavação e Reaterro				VB		5,00	a	5,00										
Pagamento						5,00			5,00									
b)Forn. e Concretagem				M3	100	70,00	c	35,00	35,00									
Pagamentos																		
Salários 30%						21,00			10,50	10,50								
Materiais 50%						35,00				17,50	17,50							
Aluguel de equipamentos 20%						14,00			7,00	7,00								
2.Estrutura																		
2.1 Colunas																		
c) Forn. e colocação				UM	60	30,00	b		10,00	10,00	10,00							
Pagamento mensal						27,00				9,00	9,00	9,00						
Pagamento retenção de 10%						3,00												
2.2																		
2.1 Colunas																		
c) Fornecimento e colocação.																		
Forma de pagamento:																		
b) Mensal 30 dias após a execução dos serviços, com																		
retenção de 10% a pagar 90 dias após conclusão dos																		
serviços contratados.																		
Recebimentos Acumulados R\$ 1000								22,5	22,5	72,5	128,75	141,25	163,125	172,5	191,25	210	228,75	247,5
Superávit /Déficit								22,50	0,00	23,50	53,25	31,75	46,13	40,50	41,25	45,00	48,75	247,50

Forma de pagamento

- a Pagamento mensal, a partir do mês seguinte do encerramento da atividade.
- b Mensal 30 dias após a execução dos serviços, com retenção de 10% a pagar 90 dias após conclusão dos serviços contratados.
- c Mão de obra: 30% dos custos, no mês seguinte.
Material: 50% do custos, 60 dias fora o mês.
Aluguel de equipamentos: 20% dos custos, no mês seguinte.

Forma de recebimento

- 1 Medição: 30 dias fora o mês.
- 2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato. R\$ 22,50 X 1000

Fluxo de Caixa Projeto Galpão	UM	QTD	Custo Total/Verba R\$ 1000	Plano de Pgto.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Fundação															
1.1 Bloco															
a) Escavação e Reaterro	VB		5,00	a	5,00										
Pagamento			5,00			5,00									
b)Forn. e Concretagem	M3	100	70,00	c	35,00	35,00									
Pagamentos															
Salários 30%			21,00			10,50	10,50								
Materiais 50%			35,00					17,50	17,50						
Aluguel de equipamentos 20%			14,00			7,00	7,00								
2.Estrutura															
2.1 Colunas															
c) Forn. e colocação	UM	60	30,00	b		10,00	10,00	10,00							
Pagamento mensal			27,00				9,00	9,00	9,00						
Pagamento retenção de 10%			3,00									3,00			
2.2 Cobertura															
d) Forn. e colocação	VB		15,00	a				7,50	7,50						
Pagamento mensal			15,00						7,50	7,50					
e) Pintura	VB		60,00	a						15,00	15,00	15,00	15,00		
Pagamento mensal			60,00								15,00	15,00	15,00	15,00	
Custo Mensal Total R\$ 1000			180,00		40,00	45,00	10,00	17,50	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00		
Custo Mensal Total Acunulado R\$ 1000					40,00	85,00	95,00	112,50	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00		
Pagamento Mensal Total R\$ 1000			180,00			22,50	26,50	26,50	34,00	7,50	15,00	18,00	15,00	15,00	
Pagamento Mensal Total Acumulado R\$ 1000						22,50	49,00	75,50	109,50	117,00	132,00	150,00	165,00	180,00	
Recebimento Lucratividade de 25%															
Verba de Mobilização					22,5										
Recebimentos Mensais R\$ 1000			25,00%				50	56,25	12,5	21,875	9,375	18,75	18,75	18,75	18,75
Recebimentos Acumulados R\$ 1000					22,5	22,5	72,5	128,75	141,25	163,125	172,5	191,25	210	228,75	247,5
Sup															247,50

1 Medição: 30 dias fora o mês.
2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato: R\$ 22,50 X 1000

Aluguel de equipamentos: 20% dos custos, no mês seguinte.
Forma de recebimento
1 Medição: 30 dias fora o mês.
2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato. R\$ 22,50 X 1000

a
b
c

1

2 Verba de mobilização do canteiro, no início do contrato. R\$ 22,50 X 1000
